

## 2022 경주지역 학교 석면 모니터링 중간보고 2

- 기간: 1.19. ~ 1.27.
- 작성: 경주환경운동연합 학교석면 모니터단

### 1. 석면 교체 공정(1월 27일 기준)

	규모	사전청소	비닐보양	석면철거	정밀 청소
산대초등	699㎡				
안강초등	1,241㎡				2/4
용강초등	2,319㎡				
모화초등	849㎡				
안강전자고등	1,360㎡				

※ 모니터링 3회 실시: 집기이동 -> ①사전청소 점검 -> 비닐보양 -> ②비닐보양 점검 -> 석면철거 -> 정밀청소 -> ③잔재물 검사

### 2. 주요 활동

- 사전청소 점검: 모화초등(12/24), 용강초등(1/7), 산대초등(1/10), 안강전자고등(1/11), 안강초등(1/17)
- 비닐보양 점검: 모화초등(12/29), 용강초등(1/13), 산대초등(1/13), 안강전자고등(1/17), 안강초등(1/21)
- 잔재물 검사: 모화초등(1/10), 산대초등(1/20)

### 3. 주요 점검 사항

- 산대초등: <잔재물 검사> •청소 대체로 잘 되어 있음. 천장 에어컨 1대 청소 불량, 후관 건물 현관의 천장 청소 불량, 현장 조치하고 잔재물 검사 종료.  
**(조치)** ☞ 청소 불량인 지점 현장에서 곧바로 재청소하고 잔재물 검사 종료
- 안강초등: <비닐보양> •비닐보양 대체로 잘 되어 있음. 방송실의 비닐보양이 철거 대상인 방음벽(석면자재)에 덧대어 있음. 영어교실의 비닐보양이 철거 대상인 천장 인테리어에 덧대어 있음. 복도 비닐보양이 외풍에 불룩하게 떠 있음.  
**(조치)** ☞ 비닐보양 잘못된 곳 보수. 교실의 작업 감시창을 추가 설치.  
 ☞ 복도의 비닐보양을 외풍에 뜨지 않도록 보강.
- 용강초등: 석면 철거 완료 후 정밀청소 중.
- 모화초등: 석면 교체 완료.
- 안강전자고등: <비닐보양 보강> •1월 17일 지적사항 보완 완료하고 석면해체 => 천장의


콘크리트 보, 에어컨, 전선 등 비닐보양 추가. 음압기 설치 및 헤파필터 교체.

#### 4. 개선할 점

- 일정을 늦추더라도 각 단계 시공을 마무리하고 모니터링을 해야 함. 기본적으로 해야 할 비닐보양, 음압기 설치, 출입구 위생설비 설치가 마무리되지 않은 상태에서 모니터링을 하는 것은 문제가 있음.




1/17 안강전자고등학교 비닐보양  
환기구의 비닐보양이 안 되어 있음



1/19 안강전자고등학교 비닐보양 재점검  
환기구 비닐보양 완료



1/17 안강전자고등학교 비닐보양  
천장 에어컨 비닐보양이 안 되어 있음




1/19 안강전자고등학교 비닐보양 재점검  
천장의 콘크리트 보, 에어컨 비닐보양 완료




1/19 안강전자고등학교 비닐보양 재점검  
음압기 설치 및 헤파필터 교체



1/20 산대초등학교 잔재물 검사

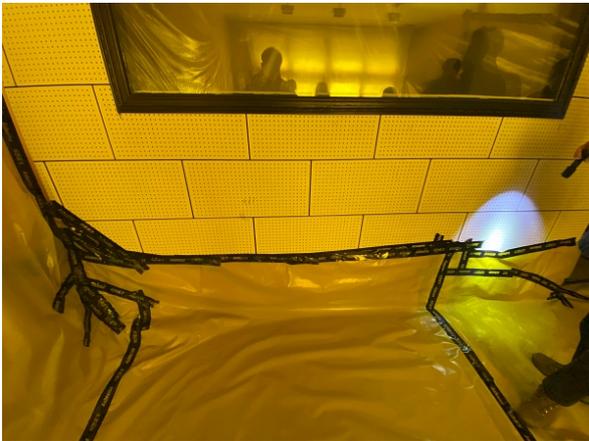



1/21 안강초등학교 비닐보양  
비닐보양이 철거하는 방음벽에 덧대어 있음



1/21 안강초등학교 비닐보양 보수



1/21 안강초등학교 비닐보양  
비닐보양이 철거하는 천장 인테리어에 덧대어 있음

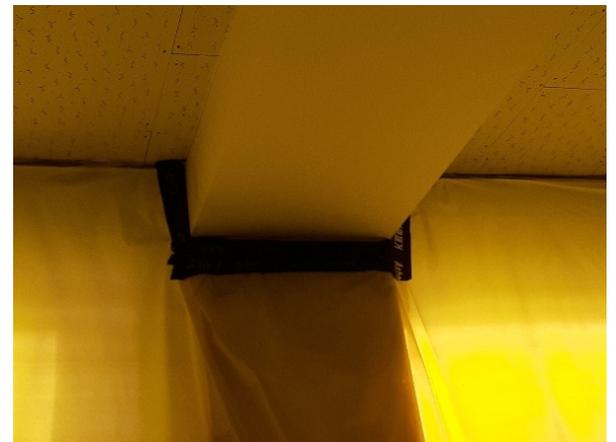

1/21 안강초등학교 비닐보양 보수
