

## 2022 경주지역 학교 석면 모니터링 중간보고 3

- 기간: 1.28. ~ 2.4.
- 작성: 경주환경운동연합 학교석면 모니터단

### 1. 석면 교체 공정(2월 4일 기준)

	규모	사전청소	비닐보양	석면철거	정밀 청소
산대초등	699㎡				
안강초등	1,241㎡				
용강초등	2,319㎡				
모화초등	849㎡				
안강전자고등	1,360㎡				

※ 모니터링 3회 실시: 집기이동 -> ①사전청소 점검 -> 비닐보양 -> ②비닐보양 점검 -> 석면철거 -> 정밀청소 -> ③잔재물 검사

### 2. 주요 활동

- 사전청소 점검: 모화초등(12/24), 용강초등(1/7), 산대초등(1/10), 안강전자고등(1/11), 안강초등(1/17)
- 비닐보양 점검: 모화초등(12/29), 용강초등(1/13), 산대초등(1/13), 안강전자고등(1/17), 안강초등(1/21)
- 잔재물 검사: 모화초등(1/10), 산대초등(1/20), 용강초등(1/28), 안강전자고등(1/28), 안강초등(2/4)

### 3. 주요 점검 사항

- 산대초등: 석면 철거 종료.
- 안강초등: <잔재물검사> •청소 대체로 잘 되어 있음. 석면 조각 발견 안 됨.  
(조치) ☞ **청소 미진한 2곳 곧바로 재청소하고 잔재물 검사 종료**
- 용강초등: <잔재물검사> •전반적으로 청소 상태 불량함. 곳곳에서 석면조각 다수 발견. 석면폐기물 적치장에도 석면조각 발견. 천장 달대의 행거가 제거되지 않음. 청소전문업체에 의뢰하지 않고 석면 철거 업체에서 정밀청소 실시.  
(조치) ☞ **2월 3일 부분적으로 청소를 다시 실시하고 교육청 담당자 점검 후 잔재물 검사 종료**
- 모화초등: 석면 철거 종료.

- 안강전자고등: <잔재물검사> •전반적으로 청소 상태 양호함. 석면 조각 발견 안 됨.  
(조치) ☞ 모니터링 후 보완청소를 하고 감리가 점검 후 잔재물 검사 종료

**4. 개선할 점**

- 석면 철거 후 정밀청소는 철거 업체에서 직접할 것이 아니라 청소전문용역업체에 맡겨서 해야 함.




1/28 용강초등학교 잔재물 검사  
교실 바닥에서 석면 조각 발견



1/28 용강초등학교 잔재물 검사  
실습실 싱크대 아래 청소 안 됨




1/28 용강초등학교 잔재물 검사  
교실 바닥 청소 안 됨

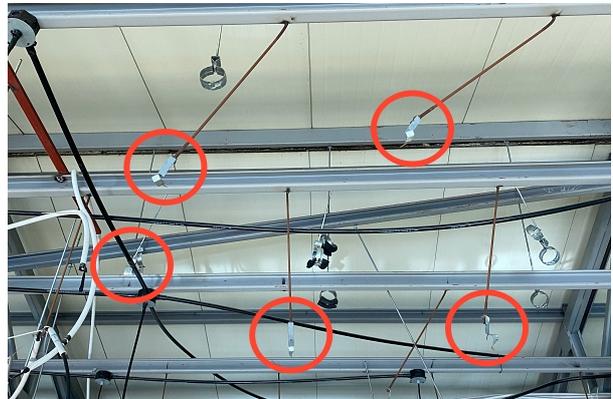

1/28 용강초등학교 잔재물 검사  
4층 천장의 행거 철거 안 됨. 석면 텍스를 지지하고 있던 시설물이기 때문에 철거해야 함.



1/28 안강전자고등학교 잔재물 검사  
일부 미진한 곳들 보완 청소 실시

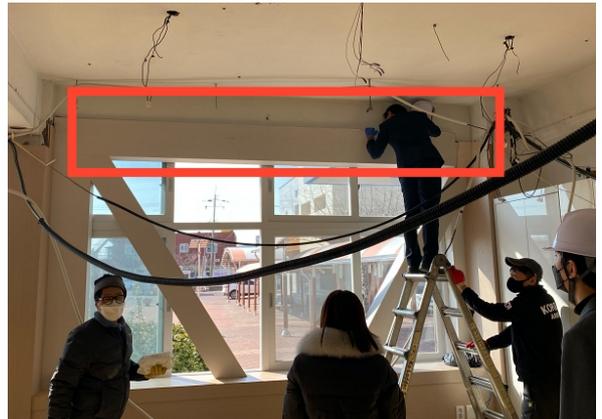

2/4 안강초등학교 잔재물 검사  
지진보강 마감재 틈새 청소 안 됨
